



שדרוג גן נורדא



מזהה	מצב פעילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי ראשון					חצי שני									
						ינו	מרץ	אפר	מאי	יוני	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ	ינו	מרץ	אפר	מאי	יוני
1		פרויקט-שדרוג גן נורדא	days 255	01/05/23	21/04/24															
2		הקמת אתר ופירוקים	days 19	01/05/23	25/05/23															
3		הקמת אתר	days 19	01/05/23	25/05/23															
4		הצבת הסדר תנועה	days 2	01/05/23	02/05/23															
5		גידור האתר באמצעות איסכורית וגדר מדברת	days 5	03/05/23	09/05/23															
6		הדבקת מדבקות	days 2	10/05/23	11/05/23															
7		סיום הקמת אתר	days 0	11/05/23	11/05/23															
8		פירוקים	days 10	14/05/23	25/05/23															
9		פירוק ריצוף ואבני גן/שפה	days 10	14/05/23	25/05/23															
10		פירוק בטונים והריסת מבנה גרטור ישן	days 10	14/05/23	25/05/23															
11		פירוק ריהוט רחוב והחזרתם לעירייה	days 5	14/05/23	18/05/23															
12		פירוק מתקני משחק והחזרתם לעירייה	days 10	14/05/23	25/05/23															
13		פירוק עמודי מחסום ומעקות	days 10	14/05/23	25/05/23															


msproj11: פרוייקט: 19/02/23: תאריך:	פעילות		פעילות לא פעילה		התחלה-בלבד	
	פיצול		אבן דרך לא פעילה		סיום-בלבד	
	אבן דרך		ערסל לא פעיל		תאריך יעד	
	ערסל		פעילות ידנית		התקדמות	
	ערסל פרוייקט		משך-בלבד		התקדמות ידנית	
	פעילויות חיצוניות		סיכום ערסל ידני			
	אבן דרך חיצונית		ערסל ידני			



שדרוג גן נורדא




מזהה	מצב פעילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי ראשון					חצי שני						
						ינו	מרץ	אפר	מאי	יוני	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ	ינו	אפר
14		פירוק עמודי תאורה	5 days	14/05/23	18/05/23												
15		פירוק הצללה קיימת	5 days	14/05/23	18/05/23												
16		חשיפת שטחי גיבון	10 days	14/05/23	25/05/23												
17		עבודות פירוק ופינוי פסולת	0 days	25/05/23	25/05/23												
18		פיתוח	216 days	28/05/23	24/03/24												
19		בריכת ג'טים	105 days	28/05/23	19/10/23												
20		בניית חדר משאבות	45 days	28/05/23	27/07/23												
21		בניית חדר אגירת מים עליונים	45 days	28/05/23	27/07/23												
22		תשתית צנרת	15 days	30/07/23	17/08/23												
23		משטח ג'טים	45 days	20/08/23	19/10/23												
24		סיום בריכת ג'טים	0 days	19/10/23	19/10/23												
25		בניית חדר גנרטור	35 days	22/10/23	07/12/23												
26		גנרטור על גג מבנה העירייה	30 days	22/10/23	30/11/23												
27		חיבור גנרטור למבנה העירייה	5 days	03/12/23	07/12/23												
28		סיום	0 days	07/12/23	07/12/23												
29		תאורה ומצלמות	20 days	28/05/23	22/06/23												
30		תשתית תאורה ומצלמות	20 days	28/05/23	22/06/23												

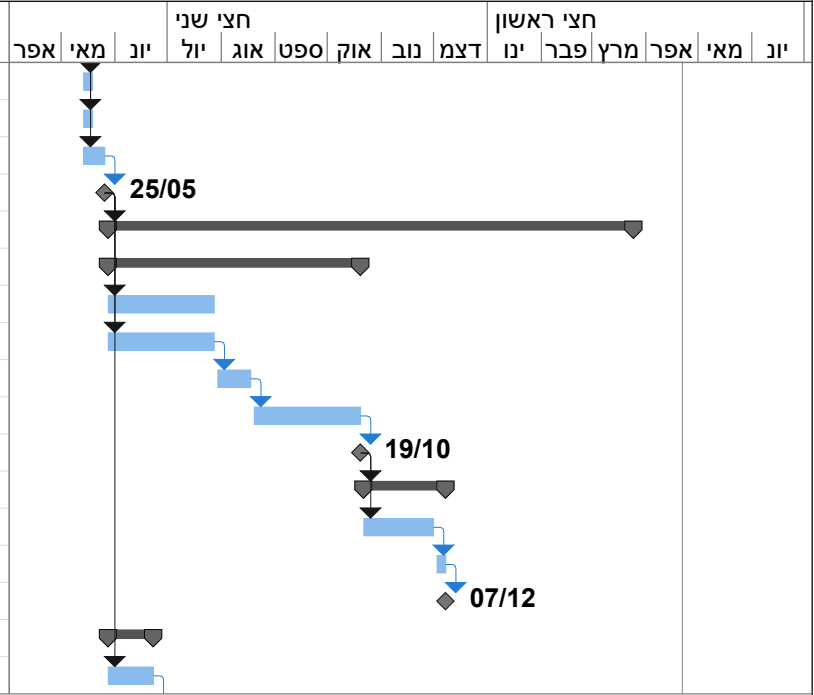

פרוייקט: msproj11 תאריך: 19/02/23	פעילות		פעילות לא פעילה		התחלה-בלבד	
	פיצול		אבן דרך לא פעילה		סיום-בלבד	
	אבן דרך		ערסל לא פעיל		תאריך יעד	
	ערסל		פעילות ידנית		התקדמות	
	ערסל פרוייקט		משך-בלבד		התקדמות ידנית	
	פעילויות חיצוניות		סיכום ערסל ידני			
אבן דרך חיצונית		ערסל ידני				



מזהה	מצב פעילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי ראשון				חצי שני									
						ינו	מרץ	אפר	מאי	יוני	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ				
31	→	סיום תשתית	0 days	22/06/23	22/06/23														
32	→	פוד טראק ושירותים	10 days	25/06/23	06/07/23														
33	→	תשתית מים וביוב	10 days	25/06/23	06/07/23														
34	→	סיום תשתית	0 days	06/07/23	06/07/23														
35	→	מתקני משחק כושר והצללות	65 days	09/07/23	05/10/23														
36	→	יציקת משטחי בטון	30 days	09/07/23	17/08/23														
37	→	הצללות מפגש קהילתי כושר ומשחק	30 days	20/08/23	28/09/23														
38	→	התקנת מתקני משחק וכושר	5 days	01/10/23	05/10/23														
39	→	סיום	0 days	05/10/23	05/10/23														
40	→	פרגולות	15 days	08/10/23	26/10/23														
41	→	בניית פרגולה ראשית	15 days	08/10/23	26/10/23														
42	→	בניית פרגולה לינארית לעמדות עבודה	15 days	08/10/23	26/10/23														
43	→	סיום	0 days	26/10/23	26/10/23														
44	→	ריצופים ודקים	50 days	29/10/23	04/01/24														
45	→	ריצוף מדרכות באריחי גרניט	15 days	29/10/23	16/11/23														

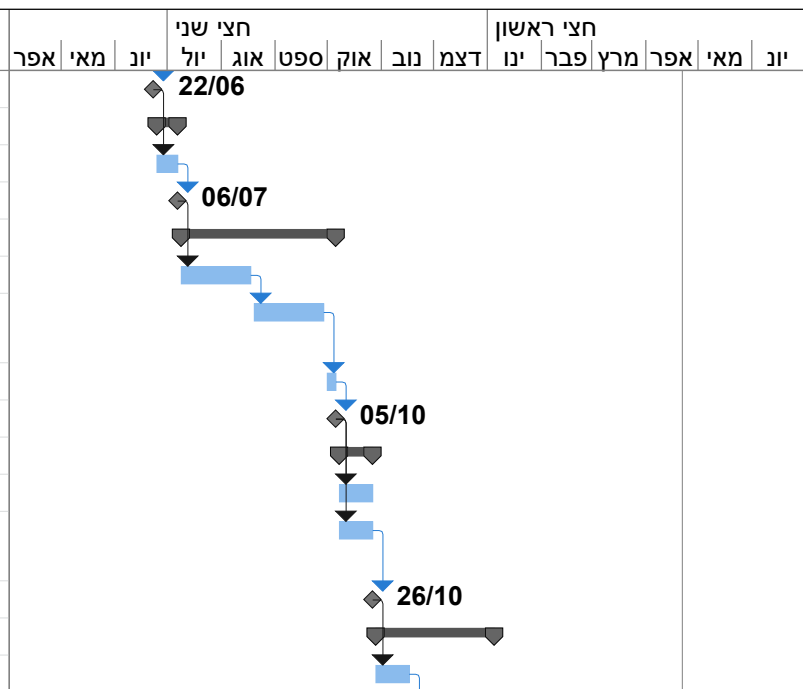


פרוייקט: msproj11 תאריך: 19/02/23	פעילות	פעילות לא פעילה	התחלה-בלבד
	פיצול	אבן דרך לא פעילה	סיום-בלבד
	אבן דרך	ערסל לא פעיל	תאריך יעד
	ערסל	פעילות ידנית	התקדמות
	ערסל פרוייקט	משך-בלבד	התקדמות ידנית
	פעילויות חיצוניות	סיכום ערסל ידני	
אבן דרך חיצונית	ערסל ידני		



שדרוג גן נורדא



מזהה	מצב פעילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי ראשון					חצי שני					
						ינו	מרץ	אפר	מאי	אפר	יוני	יולי	אוג	ספט	אוק	נוב
46	→	PARKWAYS ריצוך מדרכות	20 days	19/11/23	14/12/23											
47	→	ריצוף דק במבוק	15 days	17/12/23	04/01/24											
48	→	סיום	0 days	04/01/24	04/01/24											
49	→	חידוש טריבונוה	26 days	07/01/24	11/02/24											
50	→	שיפוץ קירות ישיבה	7 days	07/01/24	15/01/24											
51	→	חידוש מעקה	5 days	16/01/24	22/01/24											
52	→	שיפוץ מדרגות	7 days	23/01/24	31/01/24											
53	→	שיפוץ דקים	7 days	01/02/24	11/02/24											
54	→	סיום	0 days	11/02/24	11/02/24											
55	→	ריהוט רחוב	5 days	12/02/24	18/02/24											
56	→	התקנת ריהוט רחוב	5 days	12/02/24	18/02/24											
57	→	סיום	0 days	18/02/24	18/02/24											
58	→	תאורה	20 days	19/02/24	17/03/24											
59	→	התקנת גופי תאורה	20 days	19/02/24	17/03/24											
60	→	חיבור למקור הזנה	10 days	19/02/24	03/03/24											
61	→	גיבון והשקיה	15 days	04/03/24	24/03/24											
62	→	הכנת השטח	10 days	04/03/24	17/03/24											

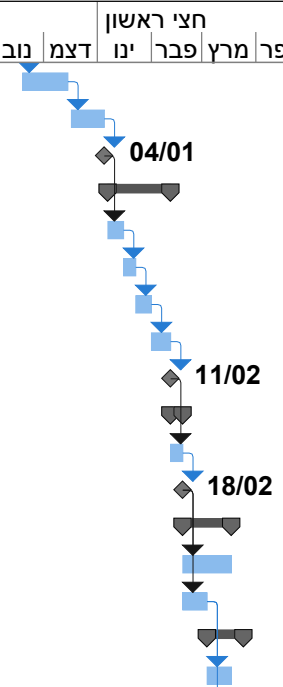


פרוייקט: msproj11 תאריך: 19/02/23	פעילות לא פעילה	התחלה-בלבד
	אבן דרך לא פעילה	סיום-בלבד
	ערסל לא פעיל	תאריך יעד
	פעילות ידנית	התקדמות
	משך-בלבד	התקדמות ידנית
	סיכום ערסל ידני	
ערסל ידני		



שדרוג גן נורדא



מזהה	פעילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי ראשון																
						אפר	מאי	יוני	יולי	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ	ינו	פבר	מרץ					
63		→	פריסת צנרת השקיה והתקנת ראש מערכת	10 days	04/03/24	17/03/24																
64		→	שתילת עצים	5 days	18/03/24	24/03/24																
65		→	שתילת צמחים	5 days	18/03/24	24/03/24																
66		→	שתילת דשא	5 days	18/03/24	24/03/24																
67		→	סיום	0 days	24/03/24	24/03/24																
68		→	מסירות והיתר בנייה	20 days	25/03/24	21/04/24																
69		→	היתר בנייה	20 days	25/03/24	21/04/24																
70		→	מסירה ראשונית	7 days	25/03/24	02/04/24																
71		→	מסירה סופית	7 days	03/04/24	11/04/24																
72		→	סיום	0 days	21/04/24	21/04/24																



פרוייקט: msproj11 תאריך: 19/02/23	פעילות		פעילות לא פעילה		התחלה-בלבד	
	פיצול		אבן דרך לא פעילה		סיום-בלבד	
	אבן דרך		ערסל לא פעיל		תאריך יעד	
	ערסל		פעילות ידנית		התקדמות	
	ערסל פרוייקט		משך-בלבד		התקדמות ידנית	
	פעילויות חיצוניות		סיכום ערסל ידני			
אבן דרך חיצונית		ערסל ידני				
