



שדרוג גן נורדאו



מזהה	מצב נילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי ראשון											
						מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל
1	🚀	פרויקט-שדרוג גן נורדאו	days 389	01/05/23	24/10/24	[Progress bar]											
2	➡	הקמת אתר ופירוקים	days 24	01/05/23	01/06/23	[Progress bar]											
3	➡	הקמת אתר	days 9	01/05/23	11/05/23	[Progress bar]											
4	➡	הצבת הסדר תנועה	days 2	01/05/23	02/05/23	[Progress bar]											
5	➡	גידור האתר באמצעות איסכורית וגדר מדברת	days 5	03/05/23	09/05/23	[Progress bar]											
6	➡	הדבקת מדבקות	days 2	10/05/23	11/05/23	[Progress bar]											
7	➡	סיום הקמת אתר	days 0	11/05/23	11/05/23	[Progress bar]											
8	➡	פירוקים	days 15	14/05/23	01/06/23	[Progress bar]											
9	➡	חשיפת שטחי גינון	day 1	14/05/23	14/05/23	[Progress bar]											
10	➡	פירוק בטונים והריסת מבנה גרטור ישן	days 15	14/05/23	01/06/23	[Progress bar]											
11	➡	פירוק ריהוט רחוב והחזרתם לעירייה	days 5	14/05/23	18/05/23	[Progress bar]											
12	➡	פירוק מתקני משחק והחזרתם לעירייה	days 10	14/05/23	25/05/23	[Progress bar]											
13	➡	פירוק עמודי מחסום ומעקות	days 10	14/05/23	25/05/23	[Progress bar]											
14	➡	פירוק עמודי תאורה	days 10	14/05/23	25/05/23	[Progress bar]											


פרוייקט: msproj11 תאריך: 19/02/23	פעילות		פעילות לא פעילה		התחלה-בלבד	
	פיצול		אבן דרך לא פעילה		סיום-בלבד	
	אבן דרך		ערסל לא פעיל		תאריך יעד	
	ערסל		פעילות ידנית		התקדמות	
	ערסל פרוייקט		משך-בלבד		התקדמות ידנית	
	פעילויות חיצוניות		סיכום ערסל ידני			
אבן דרך חיצונית		ערסל ידני				



שדרוג גן נורדאו



מזהה	מצב נילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי ראשון																	
						מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל						
15	→	פירוק הצללה קיימת	7 days	14/05/23	22/05/23																		
16	→	פירוק אבני גן ואבני שפה ופולח ברזל מסביב לעצים	15 days	14/05/23	01/06/23																		
17	→	סיום עבודות פירוק ופינוי פסולת	0 days	01/06/23	01/06/23																		
18	→	פיתוח	353 days	04/06/23	08/10/24																		
19	→	בריכת ג'טים	115 days	04/06/23	09/11/23																		
20	→	בניית חדר משאבות	50 days	04/06/23	10/08/23																		
21	→	בניית חדר אגירת מים עליונים	50 days	04/06/23	10/08/23																		
22	→	תשתית צנרת	20 days	13/08/23	07/09/23																		
23	→	משטח ג'טים	45 days	10/09/23	09/11/23																		
24	→	סיום בריכת ג'טים	0 days	09/11/23	09/11/23																		
25	→	בניית חדר גנרטור	45 days	12/11/23	11/01/24																		
26	→	בניית גנרטור על גג מבנה העירייה	35 days	12/11/23	28/12/23																		
27	→	חיבור גנרטור למבנה העירייה	10 days	31/12/23	11/01/24																		
28	→	סיום	0 days	11/01/24	11/01/24																		

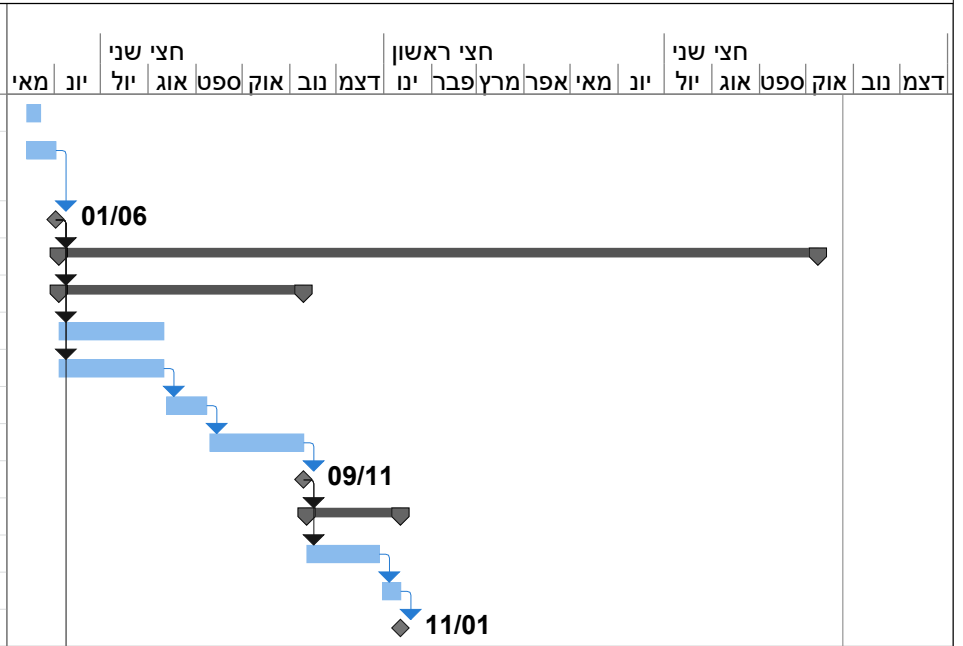


פרוייקט: msproj11 תאריך: 19/02/23	פעילות		פעילות לא פעילה		התחלה-בלבד	
	פיצול		אבן דרך לא פעילה		סיום-בלבד	
	אבן דרך		ערסל לא פעיל		תאריך יעד	
	ערסל		פעילות ידנית		התקדמות	
	ערסל פרוייקט		משך-בלבד		התקדמות ידנית	
	פעילויות חיצוניות		סיכום ערסל ידני			
אבן דרך חיצונית		ערסל ידני				



שדרוג גן נורדאו



מזהה	מצב נילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי שני																	
						מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל						
29	→	תאורה ומצלמות	25 days	04/06/23	06/07/23																		
30	→	תשתית תאורה ומצלמות	25 days	04/06/23	06/07/23																		
31	→	סיום תשתית	0 days	06/07/23	06/07/23																		
32	→	קירות ישיבה	40 days	09/07/23	31/08/23																		
33	→	רות ישיבה בחיפוי טיח וקופינג ואבן גרניט	40 days	09/07/23	31/08/23																		
34	→	סיום בניית קירות ישיבה	0 days	31/08/23	31/08/23																		
35	→	פוד טראק ושירותים	5 days	03/09/23	07/09/23																		
36	→	תשתית מים וביוב	5 days	03/09/23	07/09/23																		
37	→	סיום תשתית	0 days	07/09/23	07/09/23																		
38	→	מתקני משחק כושר והצללות	75 days	10/09/23	21/12/23																		
39	→	יציאת משטחי בטון	35 days	10/09/23	26/10/23																		
40	→	הצללות מפגש קהילתי כושר ומשחק	30 days	29/10/23	07/12/23																		
41	→	התקנת מתקני משחק וכושר	10 days	10/12/23	21/12/23																		
42	→	סיום	0 days	21/12/23	21/12/23																		
43	→	פרגולות	30 days	24/12/23	01/02/24																		

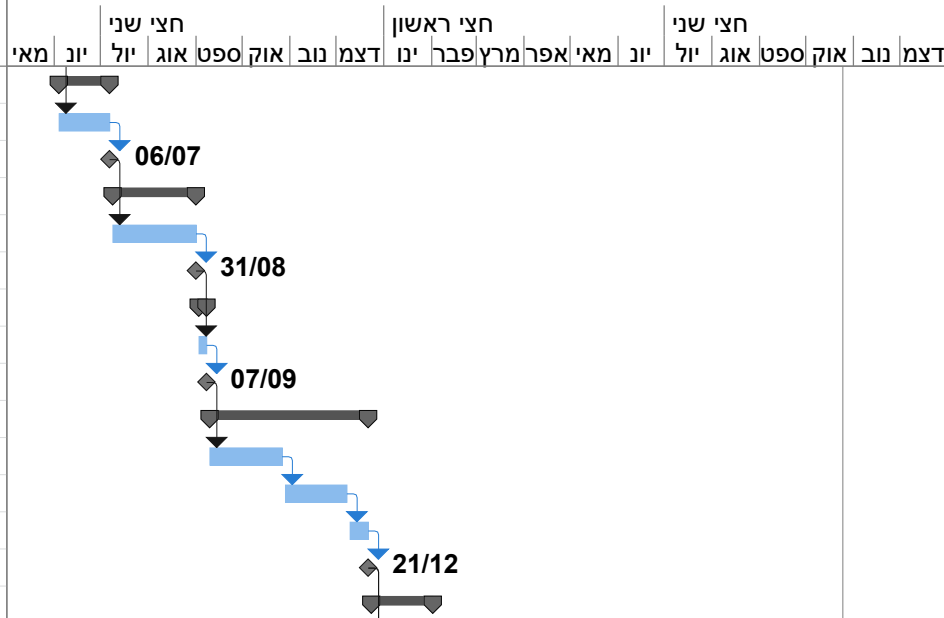


פרוייקט: msproj11 תאריך: 19/02/23	פעילות		פעילות לא פעילה		התחלה-בלבד	
	פיצול		אבן דרך לא פעילה		סיום-בלבד	
	אבן דרך		ערסל לא פעיל		תאריך יעד	
	ערסל		פעילות ידנית		התקדמות	
	ערסל פרוייקט		משך-בלבד		התקדמות ידנית	
	פעילויות חיצוניות		סיכום ערסל ידני			
אבן דרך חיצונית		ערסל ידני				



שרוג גן נורדא



מזהה	מצב נילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי שני																		
						מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל							
44	→	בניית פרגולה ראשית	30 days	24/12/23	01/02/24																			
45	→	בניית פרגולה לינארית לעמדות עבודה	30 days	24/12/23	01/02/24																			
46	→	סיום	0 days	01/02/24	01/02/24																			
47	→	ריצופים ודקים	75 days	04/02/24	16/05/24																			
48	→	ריצוף מדרכות באריחי גרניט	25 days	04/02/24	07/03/24																			
49	→	PARKWAYS ריצוף מדרכות	25 days	10/03/24	11/04/24																			
50	→	ריצוף דק במבוק	25 days	14/04/24	16/05/24																			
51	→	סיום	0 days	16/05/24	16/05/24																			
52	→	חידוש טריבונה	45 days	19/05/24	18/07/24																			
53	→	שיפוץ קירות ישיבה	15 days	19/05/24	06/06/24																			
54	→	חידוש מעקה	5 days	09/06/24	13/06/24																			
55	→	שיפוץ מדרגות	15 days	16/06/24	04/07/24																			
56	→	שיפוץ דקים	10 days	07/07/24	18/07/24																			
57	→	סיום	0 days	18/07/24	18/07/24																			
58	→	שיפוץ כניסה לבניין העירייה	58 days	21/07/24	08/10/24																			

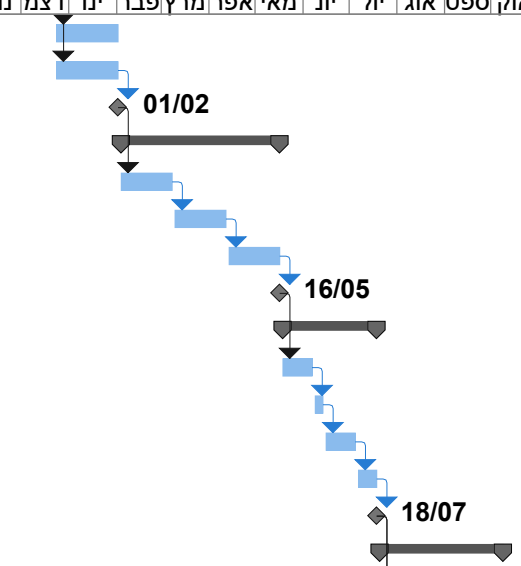


פרויקט: msproj11 תאריך: 19/02/23	פעילות		פעילות לא פעילה		התחלה-בלבד	
	פיצול		אבן דרך לא פעילה		סיום-בלבד	
	אבן דרך		ערסל לא פעיל		תאריך יעד	
	ערסל		פעילות ידנית		התקדמות	
	ערסל פרויקט		משך-בלבד		התקדמות ידנית	
	פעילויות חיצוניות		סיכום ערסל ידני			
אבן דרך חיצונית		ערסל ידני				

שדרוג גן נורדאו



מזהה	מצב נילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי ראשון																			
						מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל								
59	→	מדרגות בחיפוי אבן גרניט	20 days	21/07/24	15/08/24																				
60	→	קירות בחיפוי אבן גרניט	20 days	18/08/24	12/09/24																				
61	→	רמפת עלייה	15 days	15/09/24	03/10/24																				
62	→	מעקות לרמפת עלייה ולמדרגות	3 days	06/10/24	08/10/24																				
63	→	סיום שיפוץ כניסה למבנה העירייה	0 days	08/10/24	08/10/24																				
64	→	ריהוט רחוב	5 days	21/07/24	25/07/24																				
65	→	התקנת ריהוט רחוב	5 days	21/07/24	25/07/24																				
66	→	סיום	0 days	25/07/24	25/07/24																				
67	→	תאורה	25 days	28/07/24	29/08/24																				
70	→	גינות והשקיה	25 days	04/08/24	05/09/24																				
71	→	הכנת השטח	15 days	04/08/24	22/08/24																				
72	→	ריסת צנרת השקיה והתקנת ראש מערכת	15 days	04/08/24	22/08/24																				
73	→	שתילת עצים	10 days	25/08/24	05/09/24																				
74	→	שתילת צמחים	10 days	25/08/24	05/09/24																				
75	→	שתילת דשא	10 days	25/08/24	05/09/24																				

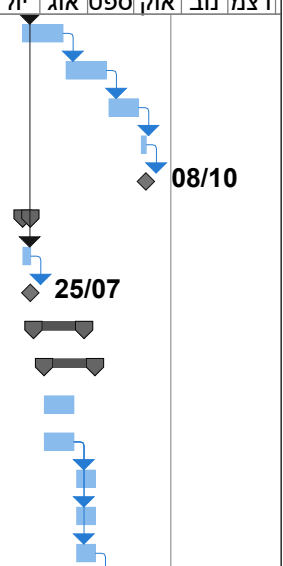


פרוייקט: msproj11
תאריך: 19/02/23

פעילות		פעילות לא פעילה		התחלה-בלבד	
פיצול		אבן דרך לא פעילה		סיום-בלבד	
אבן דרך		ערסל לא פעיל		תאריך יעד	
ערסל		פעילות ידנית		התקדמות	
ערסל פרוייקט		משך-בלבד		התקדמות ידנית	
פעילויות חיצוניות		סיכום ערסל ידני			
אבן דרך חיצונית		ערסל ידני			

שדרוג גן נורדאו



מזהה	מצב נילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	חצי שני																			
						חצי ראשון				חצי שני				חצי שלישי											
						מאי	יוני	יולי	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יוני	יולי	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
76	→	סיום	0 days	05/09/24	05/09/24																				
77	→	מסירות והיתר בנייה	35 days	08/09/24	24/10/24																				
78	→	היתר בנייה	35 days	08/09/24	24/10/24																				
79	→	מסירה ראשונית	10 days	08/09/24	19/09/24																				
80	→	מסירה סופית	10 days	22/09/24	03/10/24																				
81	→	סיום	0 days	24/10/24	24/10/24																				



פרוייקט: msproj11 תאריך: 19/02/23	פעילות		פעילות לא פעילה		התחלה-בלבד	
	פיצול		אבן דרך לא פעילה		סיום-בלבד	
	אבן דרך		ערסל לא פעיל		תאריך יעד	
	ערסל		פעילות ידנית		התקדמות	
	ערסל פרוייקט		משך-בלבד		התקדמות ידנית	
	פעילויות חיצוניות		סיכום ערסל ידני			
אבן דרך חיצונית		ערסל ידני				
